



La movilidad
es de todos

Mintransporte

PRESENTACION VEEDURIA DOBLES CALZADAS QUINDIO 11 – 02- 2022

COMPROMISO POR
COLOMBIA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA



4 dic. 2021 9:28:04 a. m.
Quindío
Consorcio Intervial Andino 1913

Información contractual

CONTRATO DE OBRA 1904 DE 2020	
NOMBRE	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
VALOR DEL CONTRATO	\$ 105.449 millones

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1913 DE 2020	
NOMBRE	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 6.000 millones

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	
INVIAS - PROYECTA Convenio 2059 de 2021	\$20.000 millones
INVIAS – FINDETER Convenio 2177 de 2021	\$ 295.500 millones

VALOR TOTAL DE INVERSION: 427.000 milones

ACTIVIDADES PRINCIPALES CONTRATO DE OBRA 1904 DE 2020

TRAMO-SECTOR	ACTIVIDAD
Sector Armenia – La María – Calarcá	Construcción de doble calzada desde el PR0+000 – al PR3+530 ruta 4003, y de la Entrada a Armenia al PR0+000 ruta 4003
Sector Armenia – Rio Espejo - Montenegro	Construcción de doble calzada desde el PR 0+000 – PR 7+600 Montenegro
Sector Montenegro- Quimbaya – Alcalá – Cartago.	Mantenimiento y rehabilitación de la vía existente.

SECTOR ARMENIA - LA MARÍA - CALARCÁ



Tramo 1



SUMINISTROS DE ECONOMÍA NACIONAL												
PI N°	SECTO	OTR	COMPLETOS			MATERIALES			OBRAS			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROY	INVIAS	1100000.000										
1	INVIAS	1100000.000	10	10	10	1	10					
2	INVIAS	1100000.000	10	10	10	1	10	10	10	10	10	10

LOCALIZACIÓN

Tramo Armenia-La María – Calarcá




Este corredor vial conecta el centro oriente (E) del Municipio de Armenia con el noroccidente (NW) del Municipio de Calarcá, y tiene su inicio, PR00+0000. Luego transcurre por terrenos ondulados a montañosos hasta llegar al organizador vial o glorieta del Estadio, en zona urbana del municipio de Calarcá, el cual conduce tanto al Municipio de Cajamarca (Tolima) y hacia el Túnel de La Línea, como hacia el Municipio de Pereira (Risaralda).

Tramo Armenia - PR 3+0530 Ruta 4003



SECCIÓN TÍPICA SUBTRAMOS 1 y 3.2 (URBANOS)

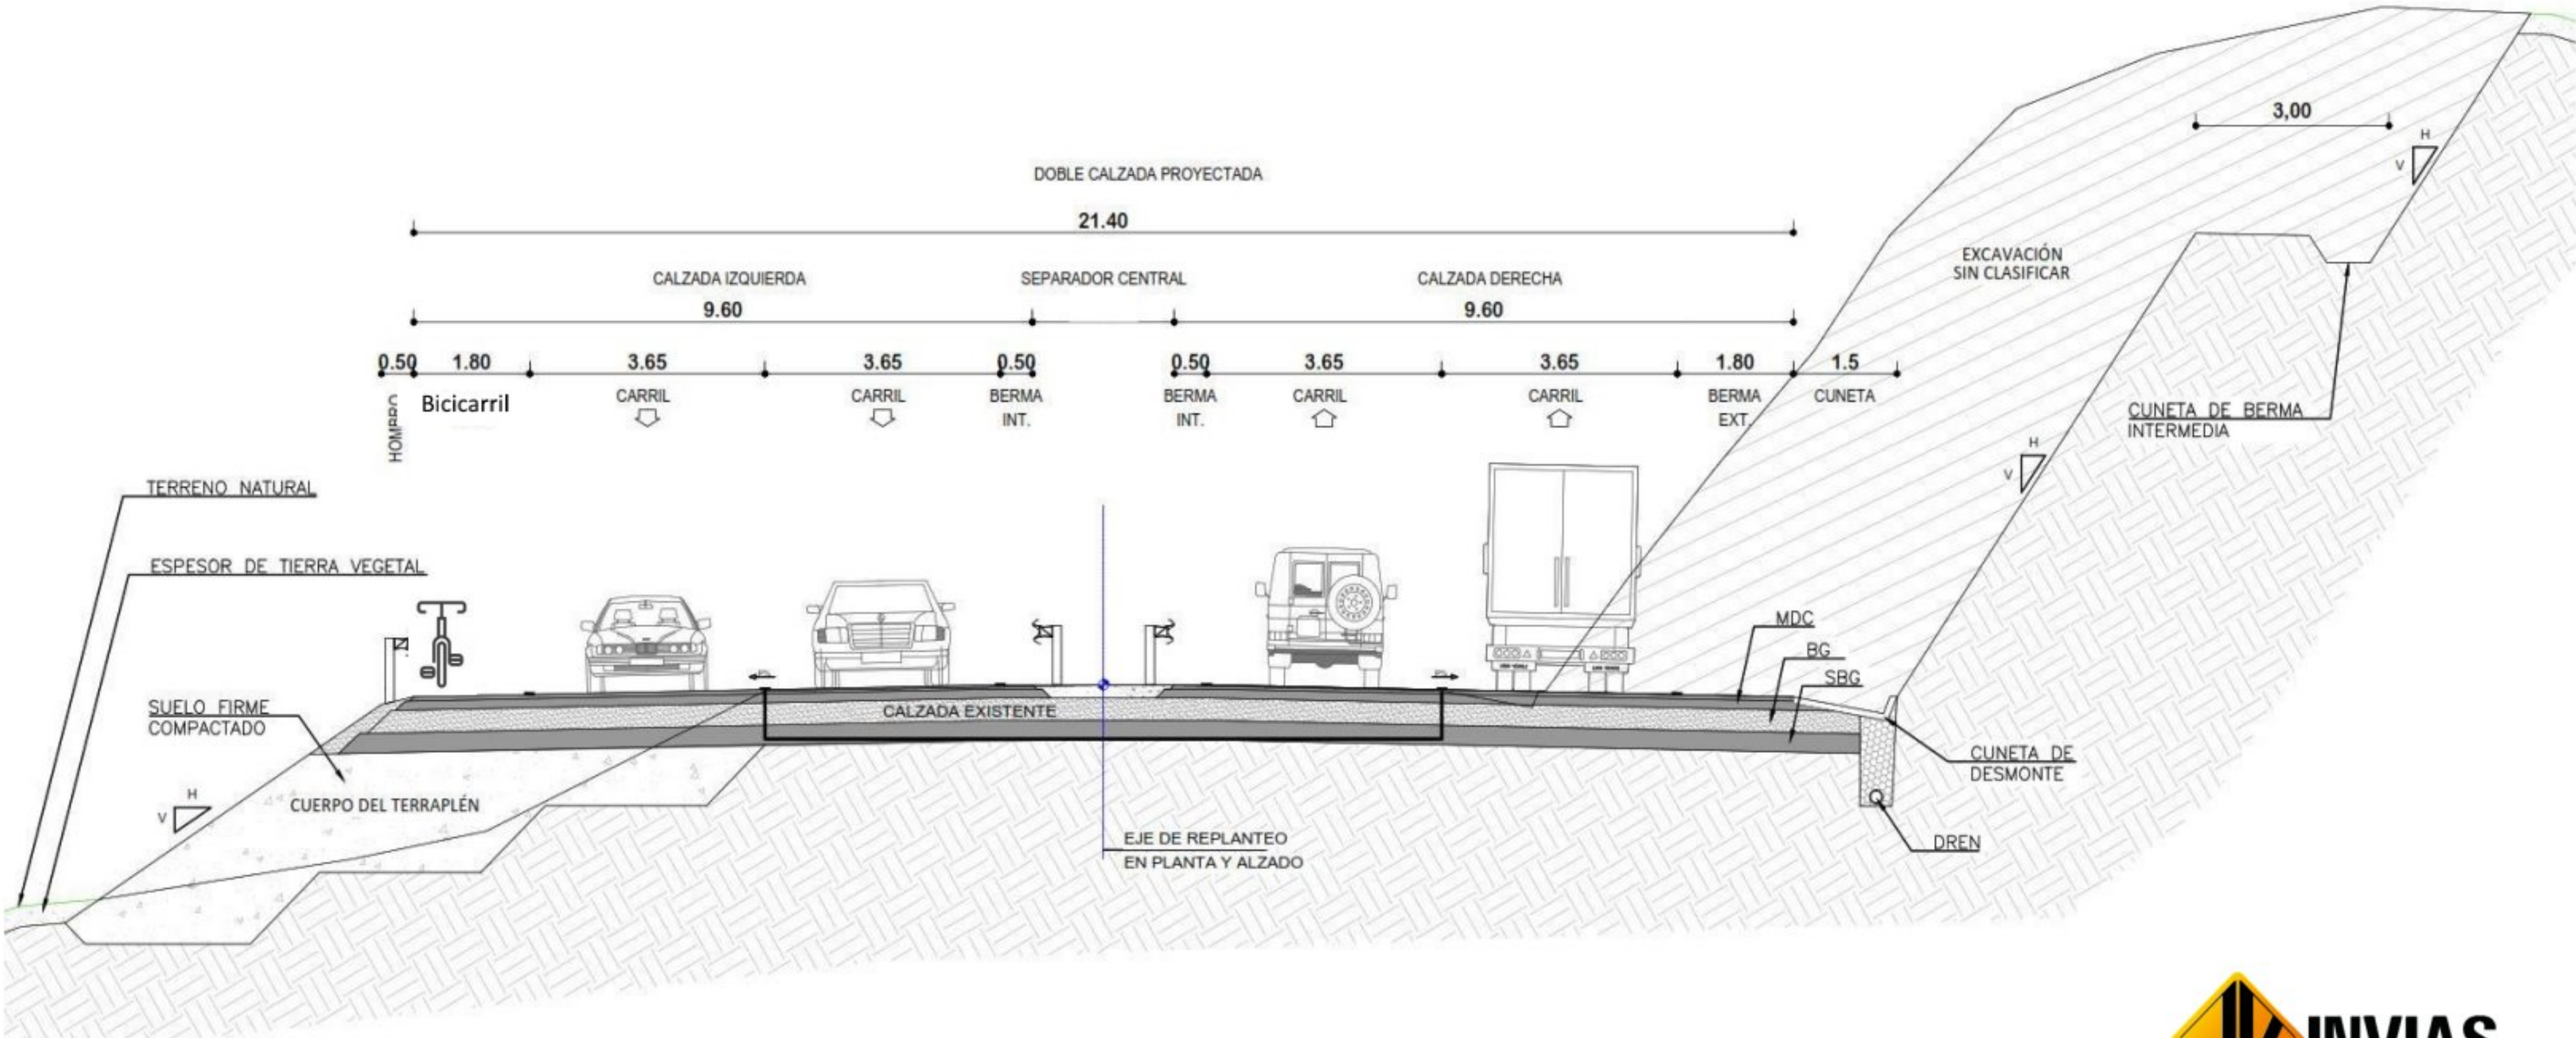

K 3+000 al K 3+582

Se plantea sección con mediana estricta, andenes a ambos lados y una velocidad de 50 Km/h. En esta zona existe un par vial que conforma una doble calzada sobre el que no se produce modificación de trazado. Al final del tramo se produce la conexión con la glorieta Calarcá-Pereira.



4. PAR VIAL “PESCADOR”

Tramo Armenia-La María - Calarcá

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

SUBTRAMO 3.2



INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA



Gestión predial PR 3+0330 – 3+0530

Subtramo 3.2 - PAR VIAL SECTOR PESCADOR (CALARCÁ) – GLORIETA EL ESTADIO (CALARCÁ) – TRAMO PAGA

Pedios Requeridos	Ficha Predial aprobadas	Estudios de títulos y diagnóstico aprobados	En aprobación de avalúos comerciales	Pedio para aplicación de la figura de TRANSFERENCIA
3 Pr. 2 - Mej. 1	3	3	2	1
AREA LIBERADA	82,44mts Abs. Inicial K3+466,56- Abs. Final K3+549,00 (Fundación Abrazar)			

No. de Predios	Área Requerida	Costo de la Adquisición
3	2.763,44 Mts2	\$2.269.484,324


Actividades ambientales

PERMISO AMBIENTAL	ENTIDAD AMBIENTAL	ESTADO
Sustracción de la Reserva Central	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Gestión Contratista: 1. Radicado N° E1-2021-24542, del 21 de julio del 2021 2. Auto de inicio No. 215 de sept. 16/2021. Gestión Alcaldía Calarcá: 1. Radicado E1-2021-36997 de oct. 21/2021.
Permiso de aprovechamiento forestal árboles aislados	Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)	1. Radicado 12999-21 del 25 de octubre 2021. 2. Auto de inicio SRCA-AIF-1052-25-11-2021 del 25 de noviembre del 2021 3. Visita de evaluación realizada por parte de la CRQ el 4 de febrero del 2021. 4. Resolución No 000179 del 9 de febrero de 2022.
Concesión de agua Rio Quindío	Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)	1. Radicado N° 12271 del 08 de octubre del 2021. 2. Visita de evaluación realizada por la CRQ el 12 de noviembre del 2021 3. Otorgada mediante resolución 2617 de del 03 de diciembre del 2021.

Traslado de redes de servicios públicos

ACTIVIDAD	ENTIDAD	ESTADO
Traslado Redes EMCA	Contratista - EMCA	Pendiente por entregar diseño red y pendiente por ejecutar.
Traslado redes de EDEQ.	Contratista - EDEQ	Edeq pendiente por ajustar propuesta costos traslado de red. Solicitado 3 de diciembre de 2021

Intervención colégio Tecnológico

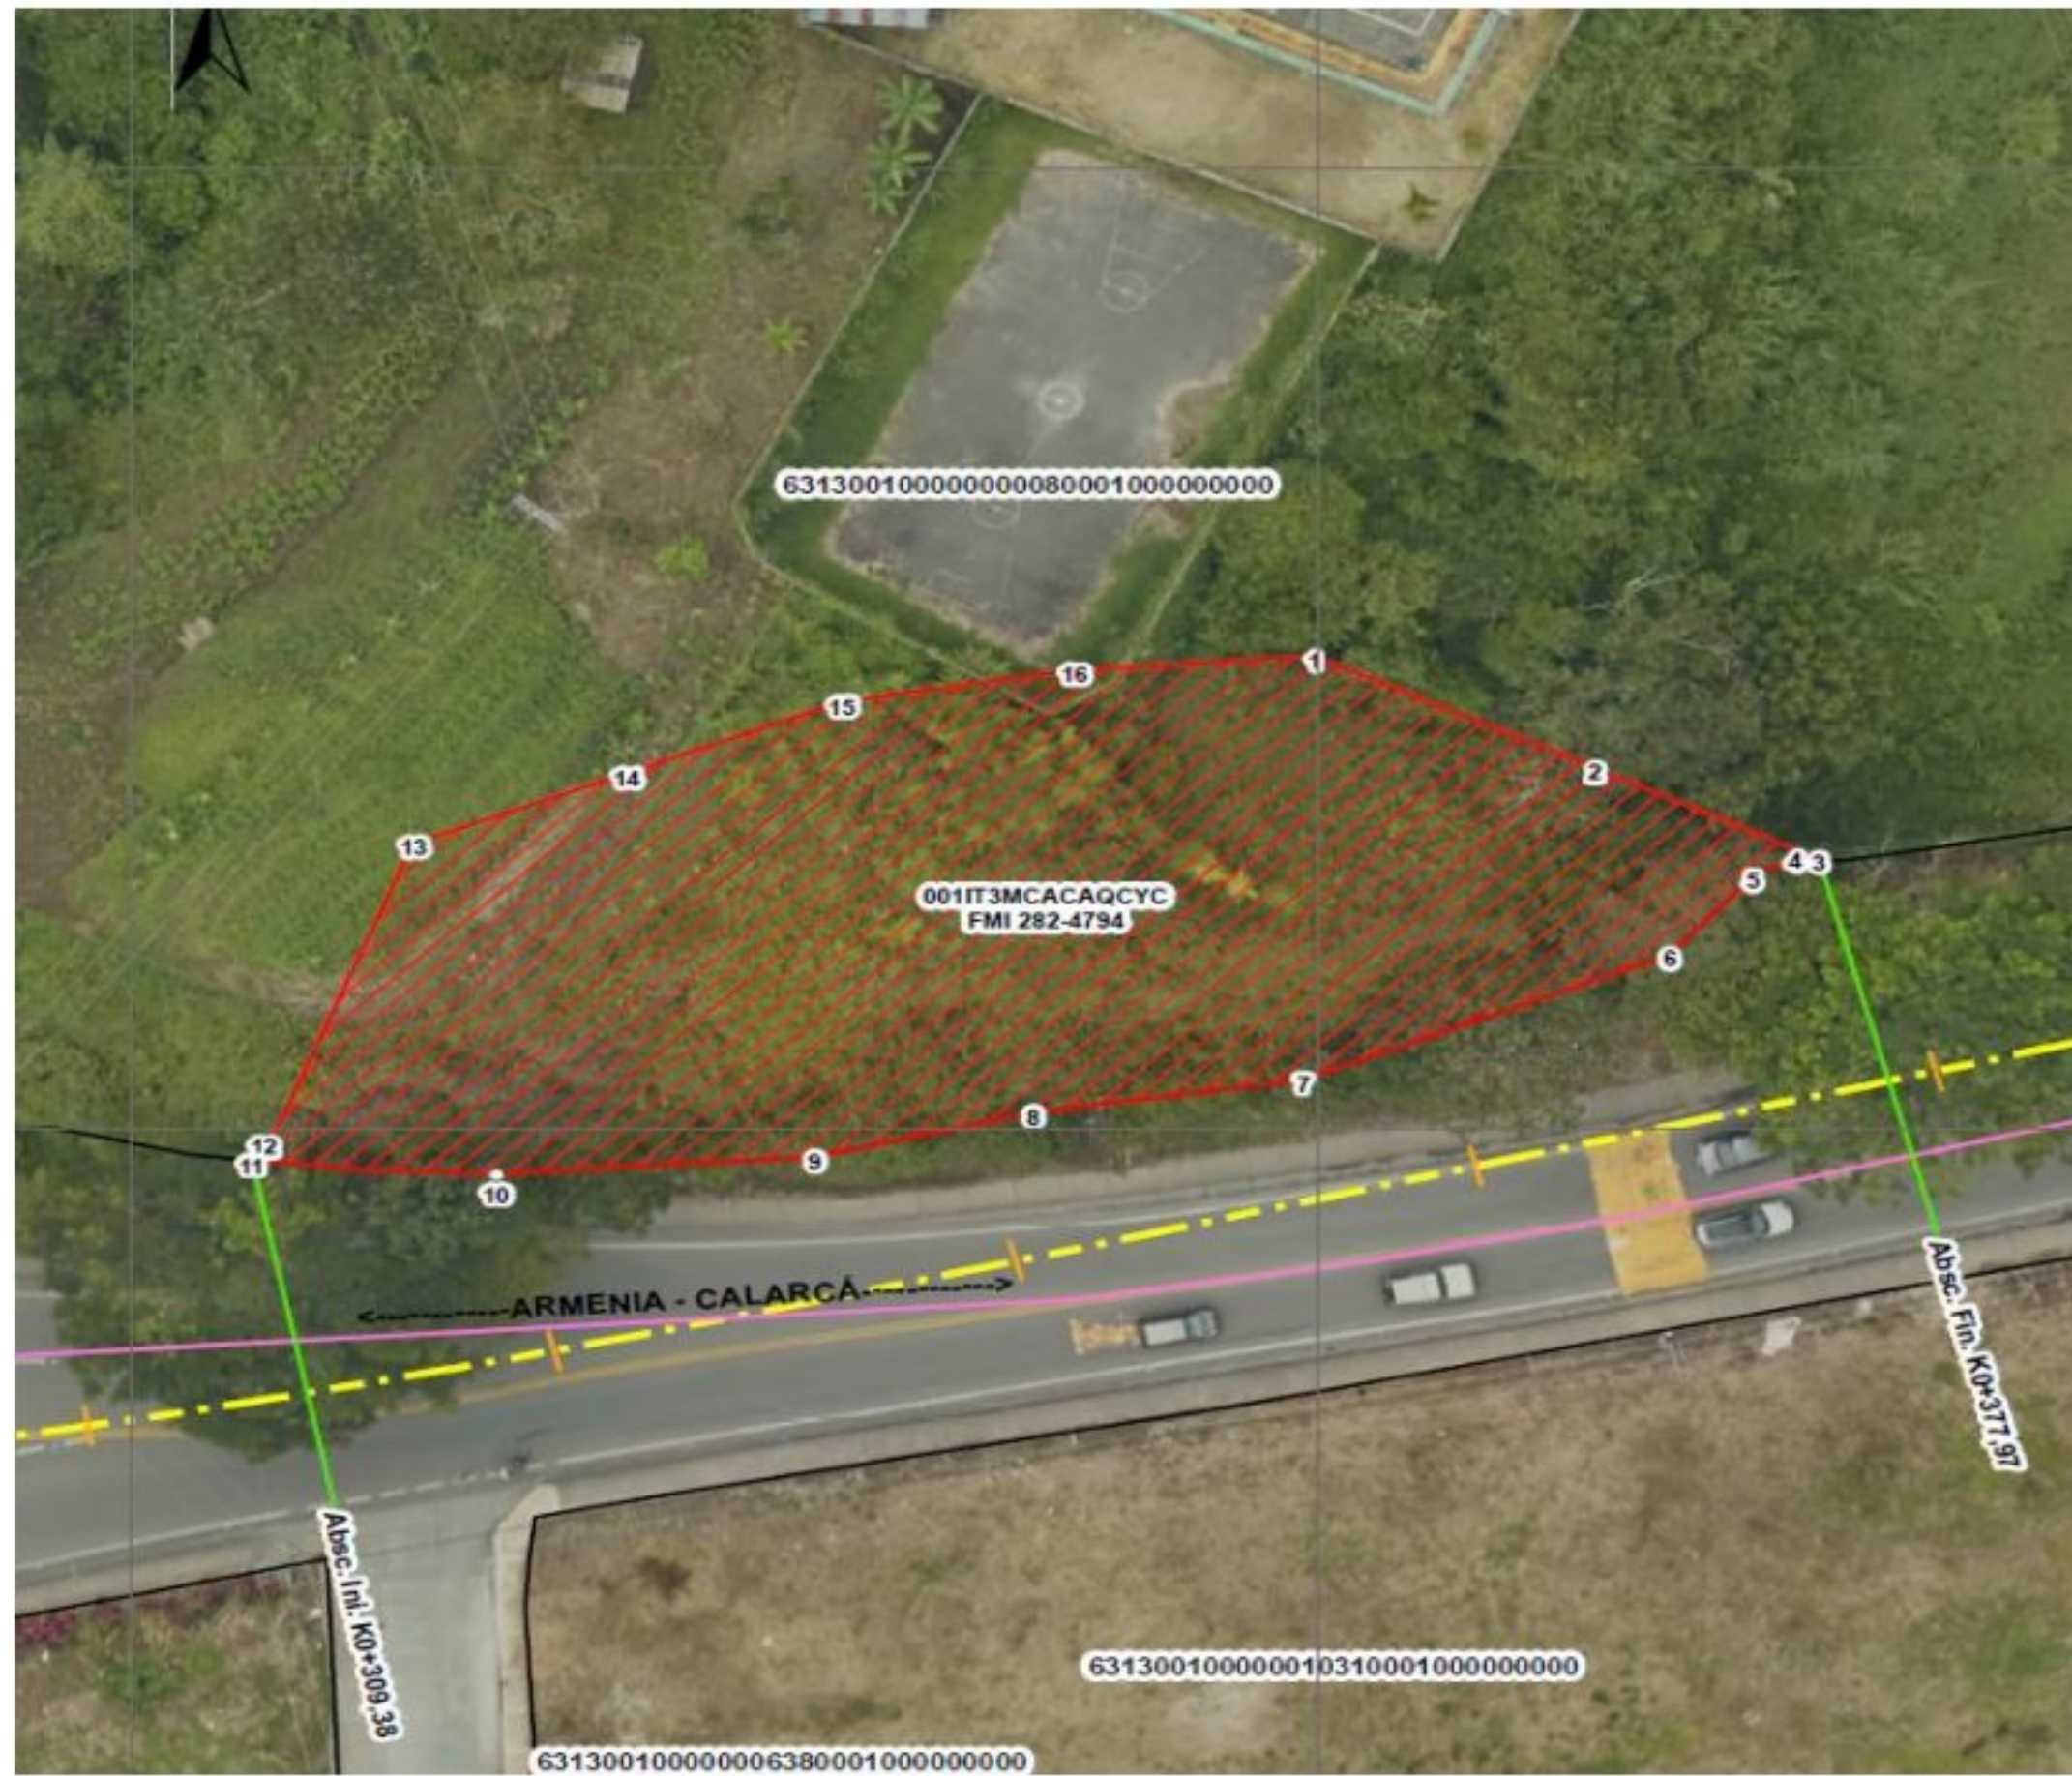

Abscisa inicial : 3+0309,38

Abscisa final : 3+0377,9


Longitud: 68,5 mts

Area requerida: 1121 m²

Citación a la asamblea departamental el 31 de enero de 2022 proyecto de ordenanza No 001 de 2022.

Viabilidad técnica para intervenir.

Intervención colégio Tecnológico

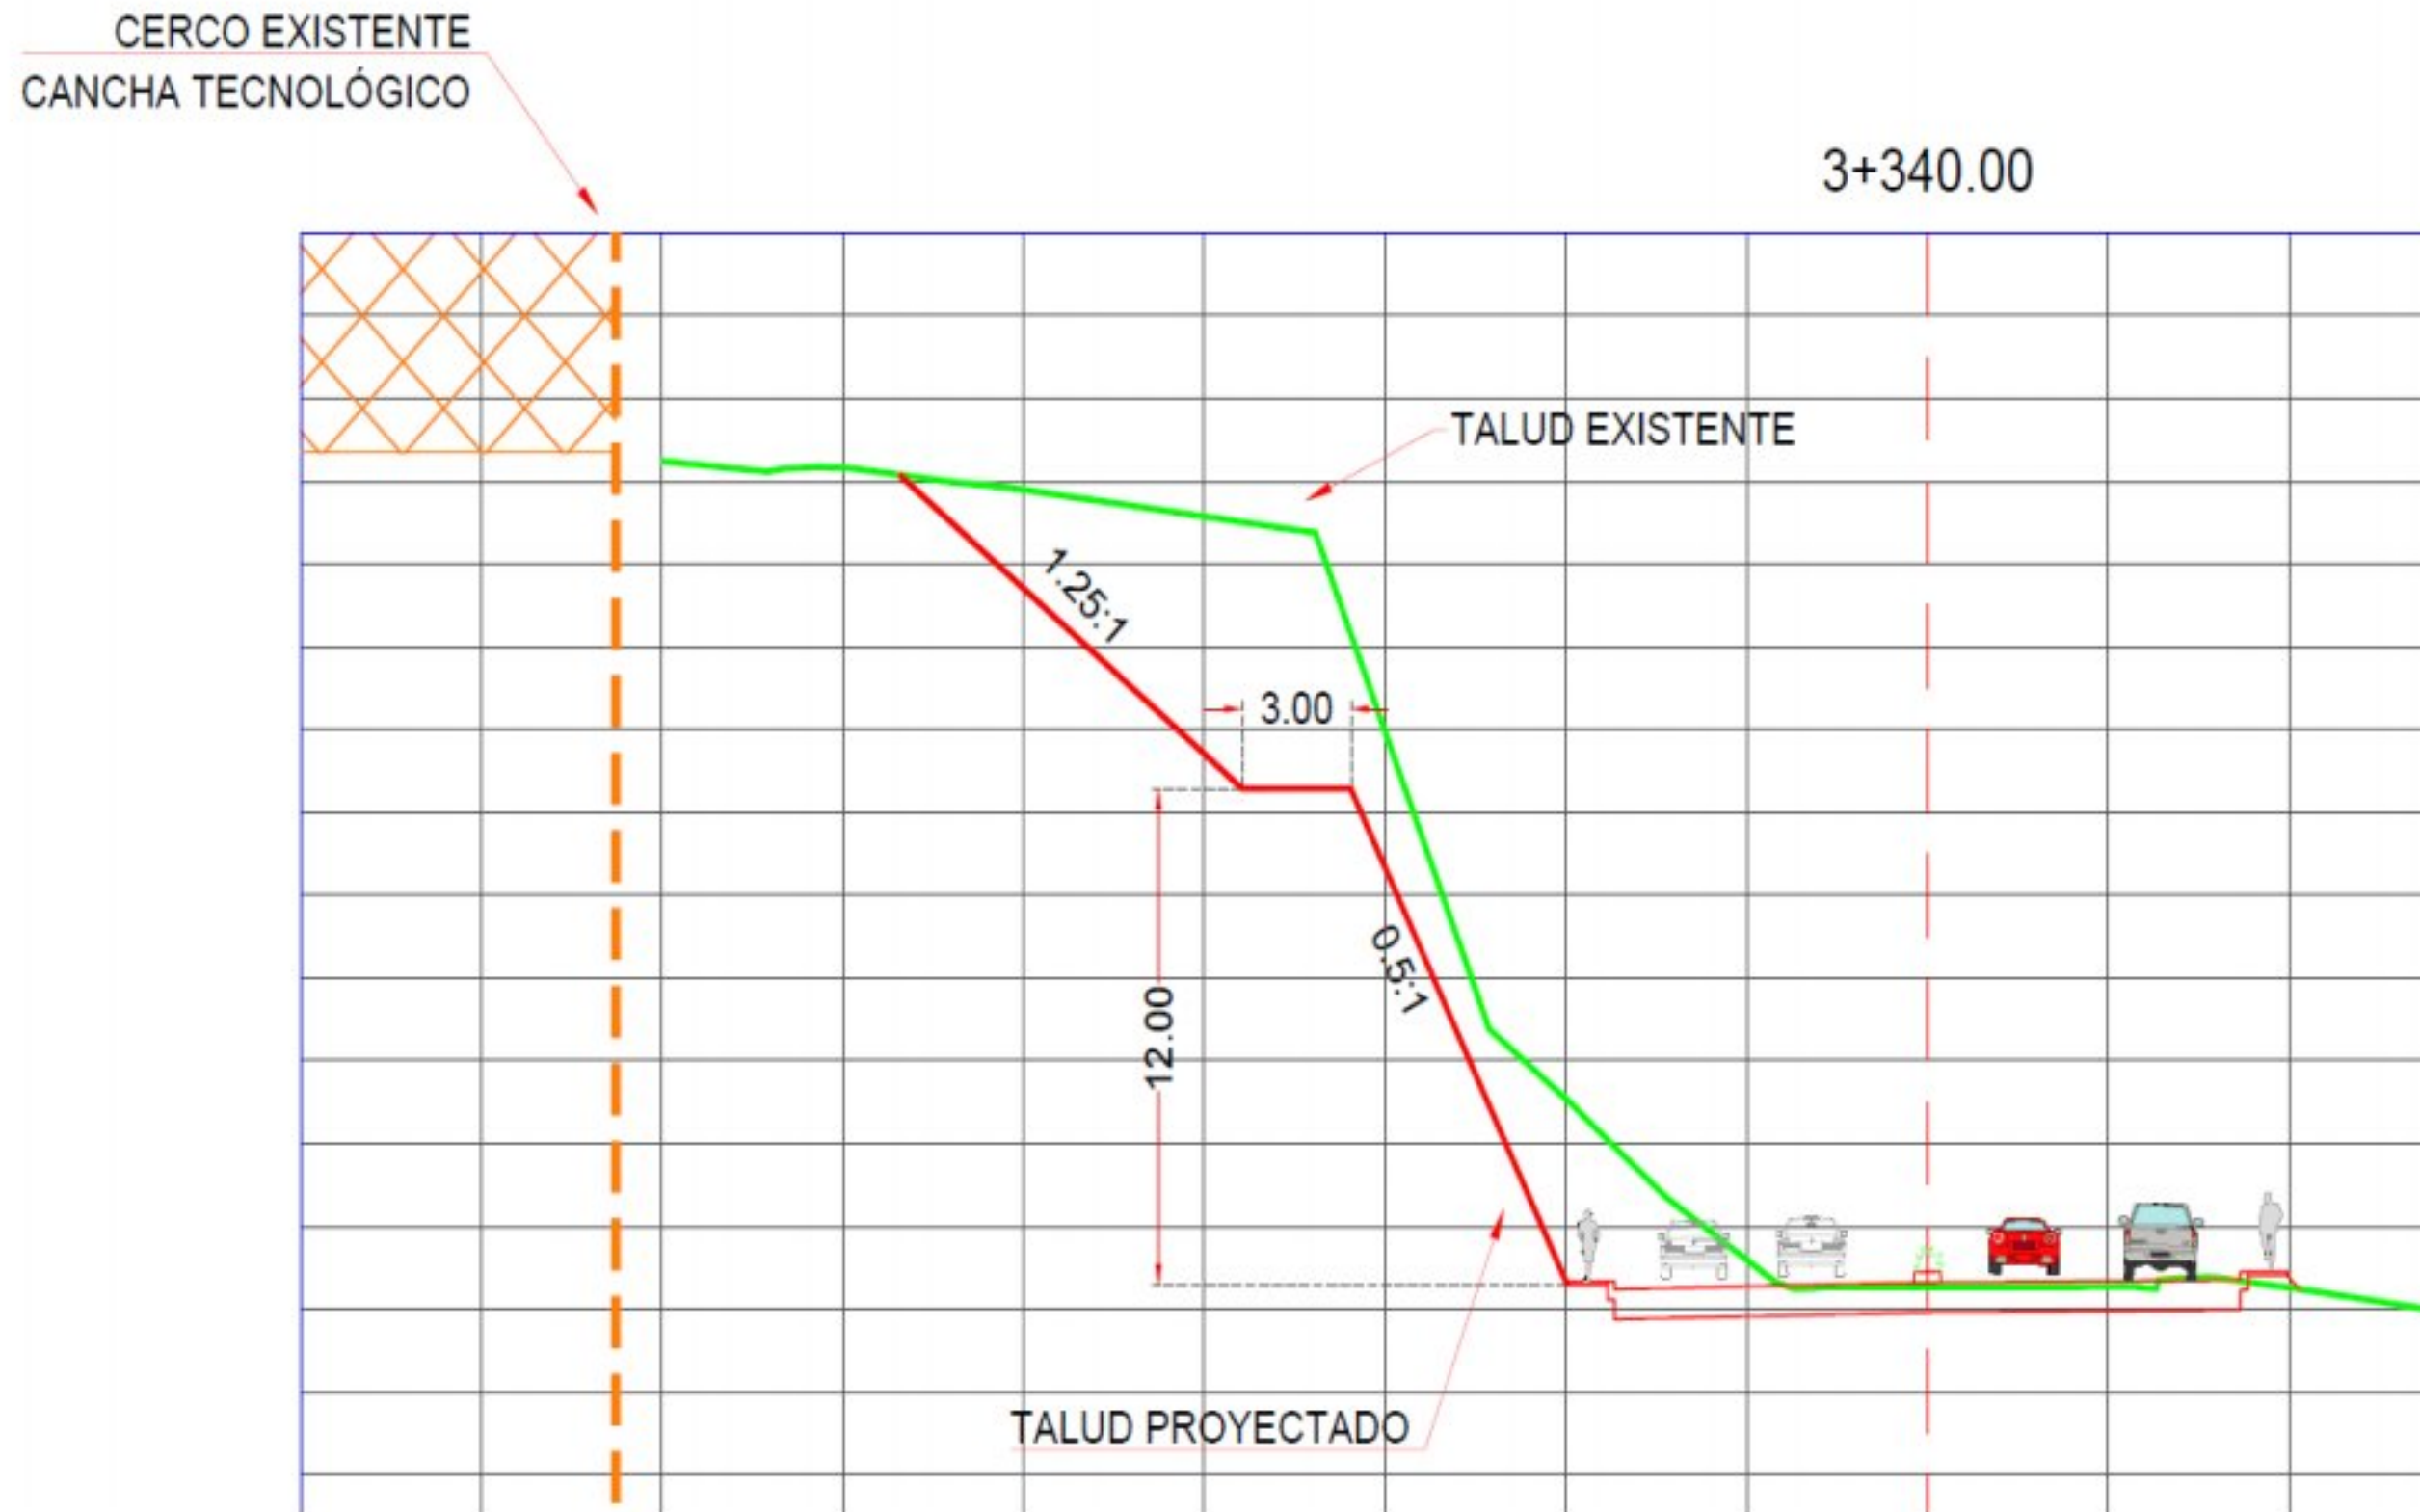

Para la ejecución de la doble calzada se requiere el Corte del talud en terrazas las cuales son estables. Se protegerá el talud con empradización y se construirán obras de drenaje.

K 1+000 al K 3+0000



En este segundo kilómetro, se plantea la ampliación de la plataforma en ambos márgenes de la vía, para conformar la doble calzada.

Se plantea la corrección de algunas curvas para conformar una trazado de Velocidad = 60Km/h.

INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA



Gestión predial

Subtramo 2 - PUENTE LA MARIA (RIO QUINDIO) – ALTO DEL RIO (CALARCÁ) y Subtramo 3.1 - ALTO DEL RIO (CALARCÁ) – PAR VIAL SECTOR PESCADOR (CALARCÁ) – **TRAMO CON LICENCIA AMBIENTAL**

Predios Requeridos	Fichas pendientes de elaboración por EIA	Estudios pendientes de elaboración por EIA
79 Pr. 64 - Mej. 15	79	79


Actividades ambientales

PERMISO AMBIENTAL	ENTIDAD AMBIENTAL	ESTADO
Sustracción de la Reserva Central	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Gestión Contratista: Radicado N° E1-2021-24542, del 21 de julio del 2021 y con auto de inicio No. 215 de sept. 16/2021. Mediante correo electrónico el Contratista solicito a Minambiente mesa de trabajo para revisión de avance del permiso de sustracción de reserva. Pendiente pronunciamiento del Ministerio Gestión Alcaldía Calarcá: Radicado E1-2021-36997 de oct. 21/2021. Alcaldía envía oficio el 13 de enero/2022 a Minambiente solicitando información del tramite de sustracción de reserva del casco urbano. PENDIENTE PRONUNCIAMIENTO DE MINAMBIENTE
Licencia Ambiental	ANLA	En ejecución EIA.

Traslado de redes de servicios públicos

ACTIVIDAD	ENTIDAD	ESTADO
Traslado Redes EMCA	EMCA	Pendiente diseño de EMCA nueva red para ejecutar.
Traslado redes de EDEQ, telemáticos.	EDEQ TELEMATICOS	Pendiente definición trazado por la empresa.

K 0+000 al K 1+000

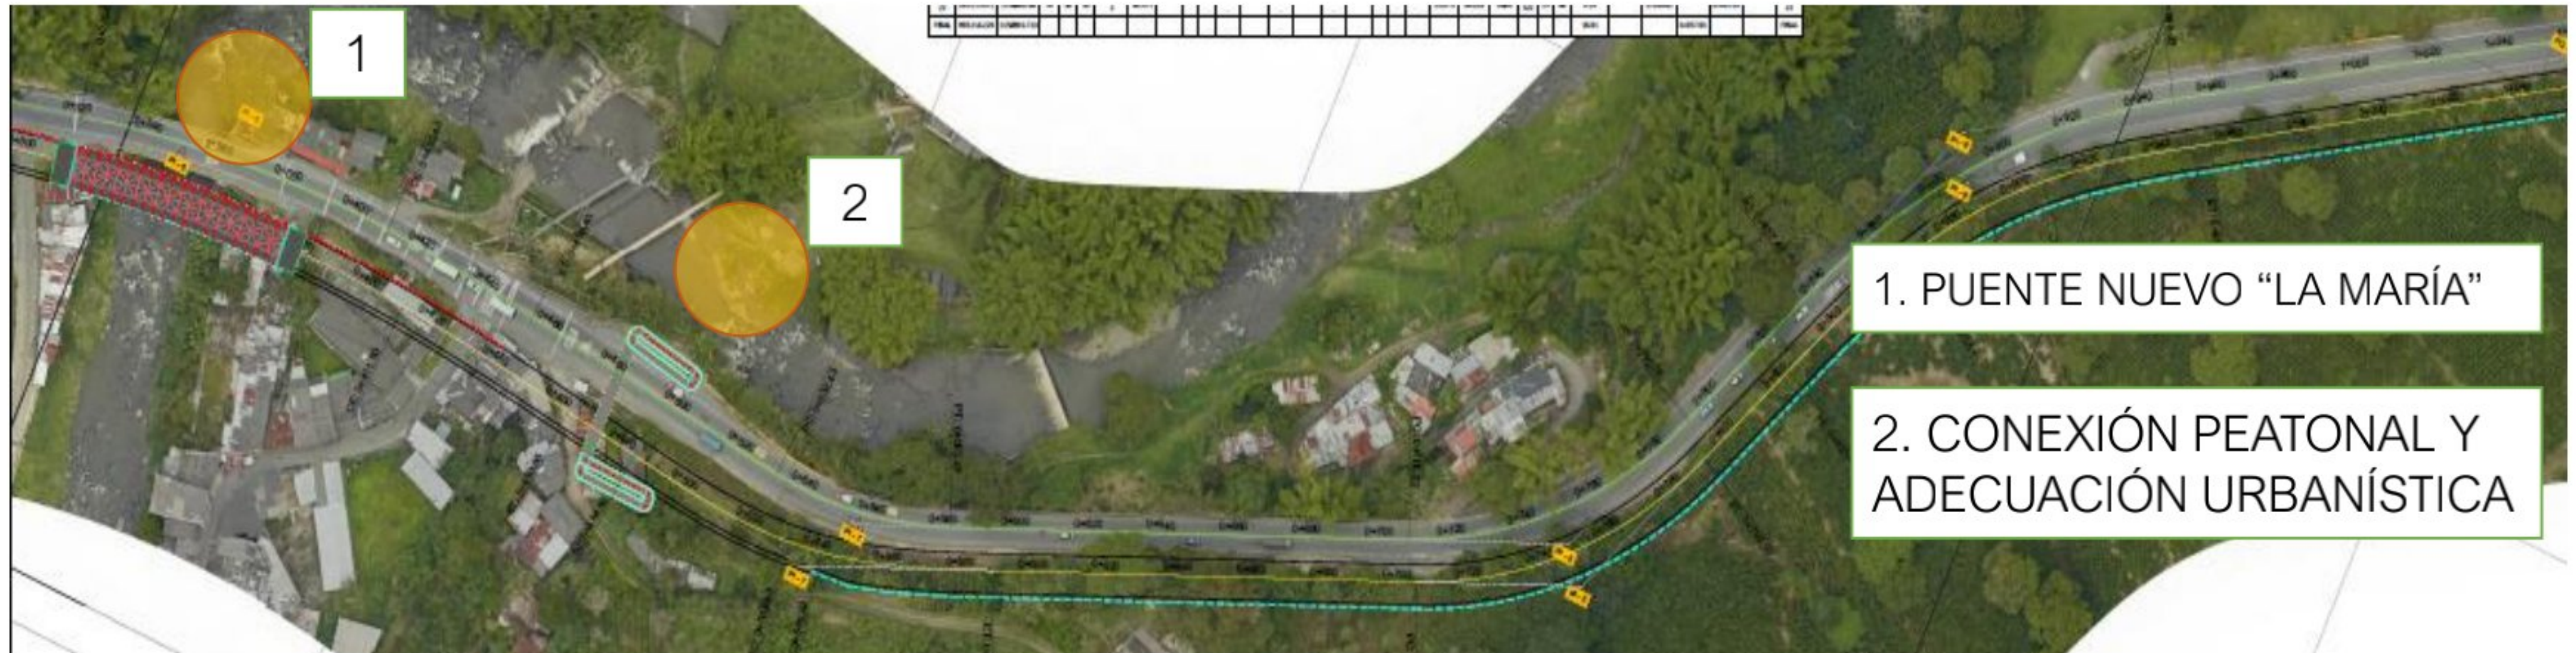

En este primer kilómetro, se ubica el puente existente para cruce del río Quindío. Se plantea la construcción de un segundo puente para la calzada derecha, junto con la adecuación del urbanismo y la conformación de accesos a las vías existentes. En ajuste diseño a Fase III

Escuela nueva la Maria



1 ESCUELA NUEVA LA MARIA

En tramite avalúo comercial para la compra del lote 0,9Ha por parte de la lonja de arquitectos del Quindío.

Área con concepto de viabilidad por parte de la alcaldía de Calarcá y en elaboración de estudios y diseños.

Reuniones con Secretaria Educación Departamental

440m

Estos primeros 440mts, se ubican desde el intercambiador de la Florida hasta el PR 0+0000 de la ruta 4003 Vía Armenia – Ibagué.

En proceso de diseño por parte del contratista Geométrico – Geotécnico – Estructural – Pavimentos – Hidráulico.



INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA



SECTOR No. 1 – ARMENIA CALARCÁ**Subtramo 1 - LA Y DE PATIO BONITO (ARMENIA) - PUENTE LA MARIA (RIO QUINDIO) – TRAMO PAGA**

Predios Requeridos por diseño	Ficha Predial aprobadas INVÍAS	Estudios de títulos aprobados INVÍAS	En elaboración de avalúos comerciales (SAQ)	En aprobación de avalúos comerciales (Interventoría)	Predios para aplicación figura TRANSFERENCIA	Fichas EN REVISIÓN CON INTERVENTORIA	Estudios EN REVISIÓN CON INTERVENTORIA
34 Pr. 23 - <u>Mej. II</u>	14	14	23	10	1	20	8
AREA LIBERADA	72,20mts <u>Abs. Inicial</u> K0+119,22 MD - <u>Abs. Final</u> K0+191,84 MD (sentido Armenia – La María - Calarcá)						
No. de Predios	Área Requerida		Costo Estimado de la Adquisición				
34	9.038,747 Mts2		\$4.945.026.340				

Actividades ambientales

PERMISO AMBIENTAL	ENTIDAD AMBIENTAL	ESTADO
Permiso de aprovechamiento forestal árboles aislados	Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)	1. Radicado 12999-21 del 25 de octubre 2021. 2. Auto de inicio SRCA-AIF-1052-25-11-2021 del 25 de noviembre del 2021 3. Visita de evaluación realizada por parte de la CRQ el 4 de febrero del 2021. 4. PAF resolución 000159 del 9 de febrero de 2022
Permiso de Levantamiento parcial de veda de flora epífita	Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)	1. Radicado 13111-21 del 28 de octubre del 2021. 2. Auto de inicio SRCA-AIF-1052-25-11-2021 del 25 de noviembre del 2021 3. Visita de evaluación realizada por parte de la CRQ el 4 de febrero del 2021. 4. PAF resolución 000159 del 9 de febrero de 2022
Concesión de agua Rio Quindío	Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)	1. Radicado N° 12271 del 08 de octubre del 2021. 2. Visita de evaluación realizada por la CRQ el 12 de noviembre del 2021 3. Otorgada mediante resolución 2617 de del 03 de diciembre del 2021.

Traslado de redes de servicios públicos

ACTIVIDAD	ENTIDAD	ESTADO
TRASLADO REDES EDEQ	EDEQ	Pendiente entrega nuevo diseño de traslado redes por parte de la EDEQ. Solicitud Diciembre 10 de 2021.
TRASLADO REDES EPA - TELEMATICOS	EPA- TELEMATICOS	Pendiente visitas

Tramo intervenido sector PR 0+0000 – Entrada Armenia: Estado Inicial



Tramo intervenido sector PR 0+0000 – Entrada Armenia: Estado Inicial




INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA



Tramo intervenido sector PR 0+0000 – Entrada Armenia: Inversión \$ 1,400 millones

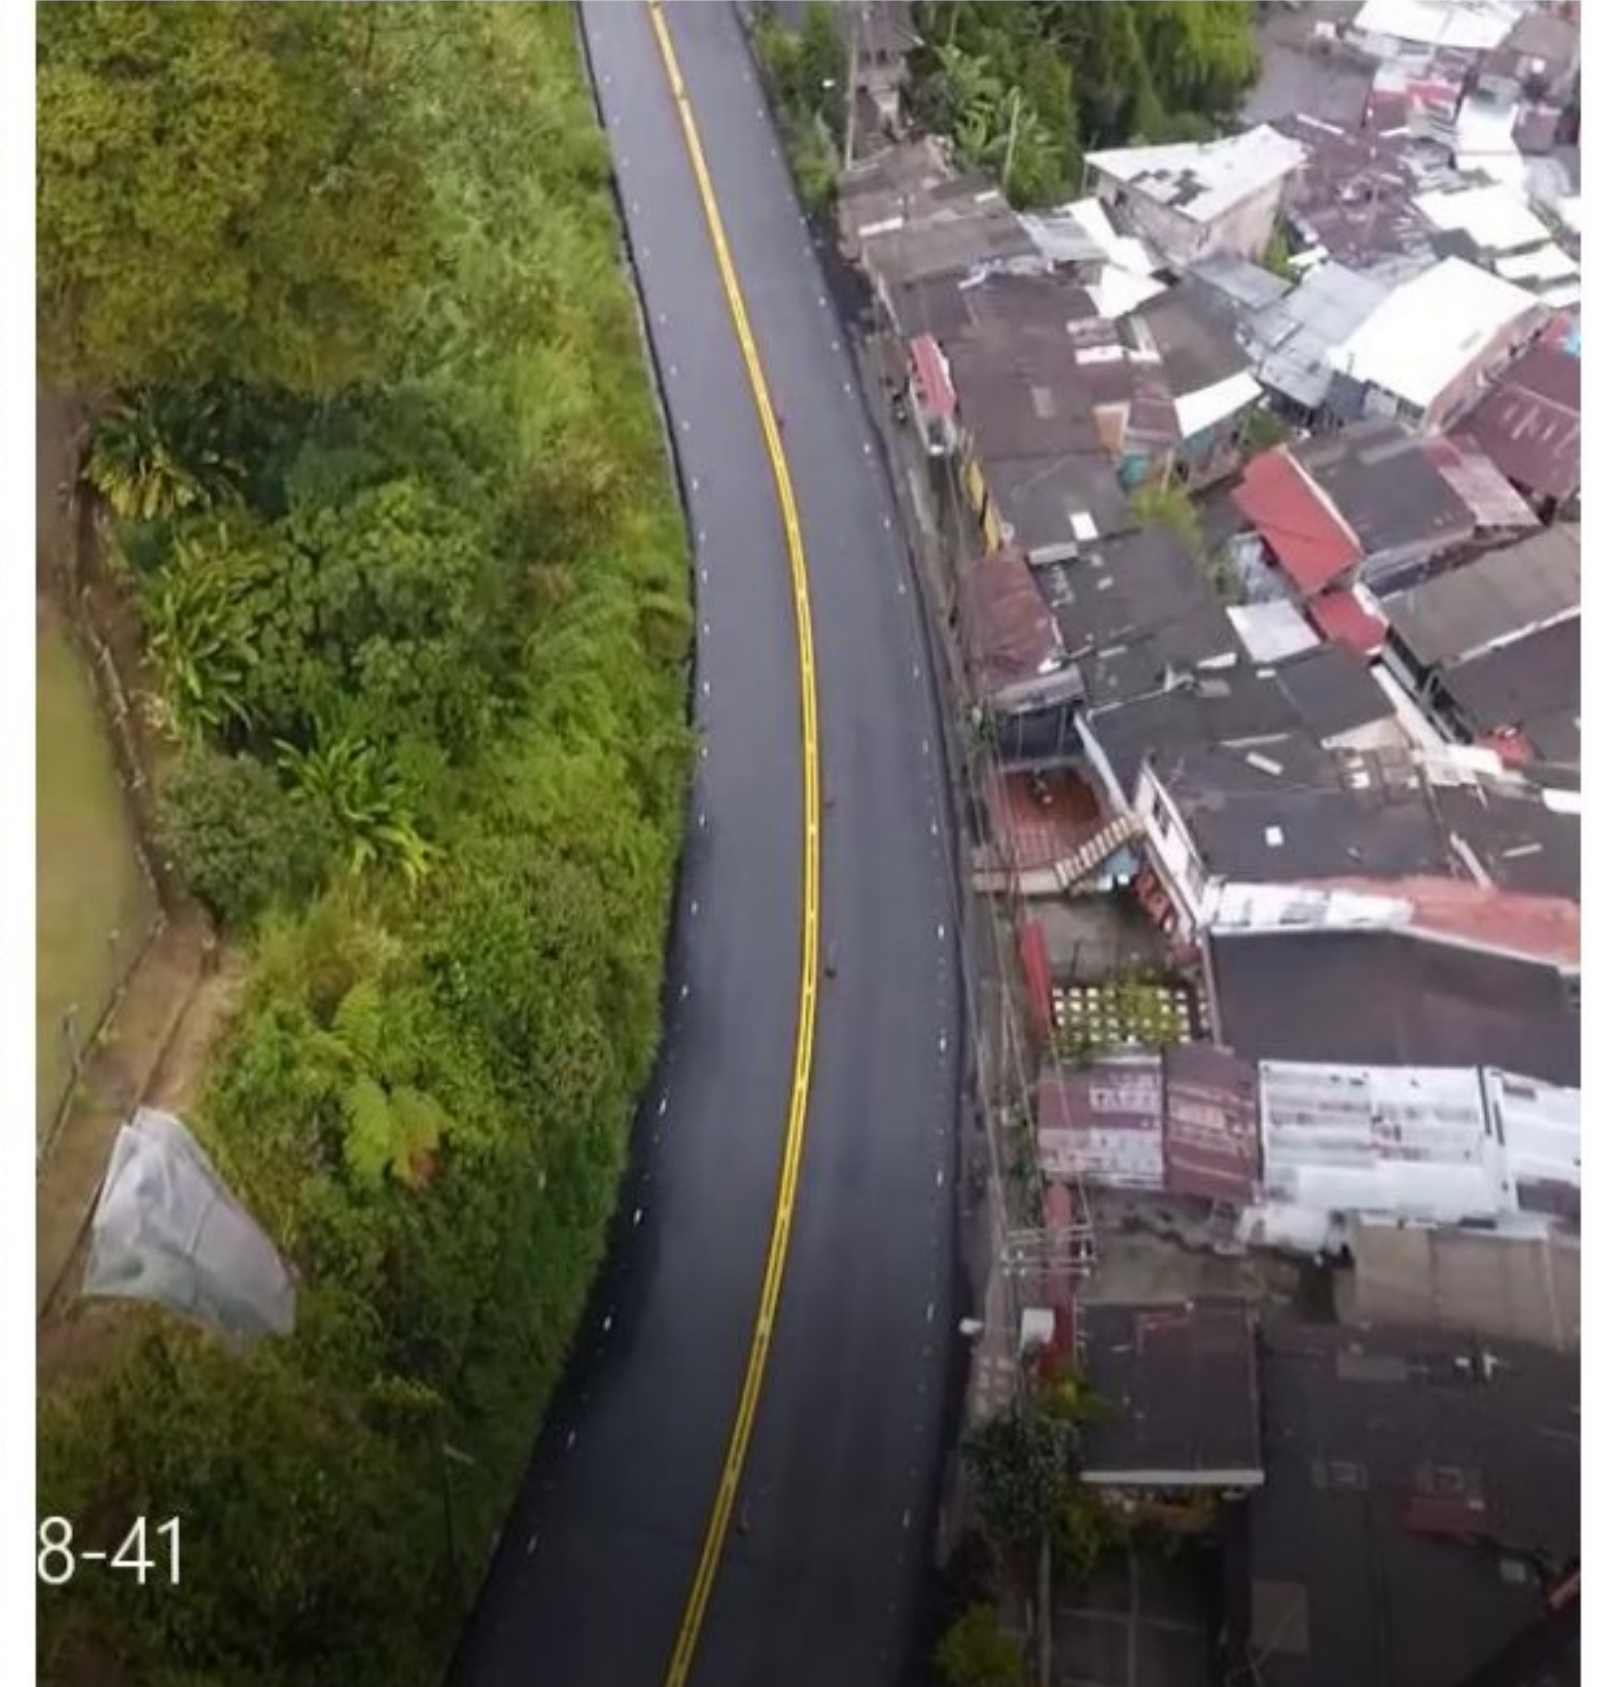

INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**


REACTIVACIÓN ECONÓMICA



Tramo intervenido sector PR 0+0000 – Entrada Armenia: Inversión \$ 1,400 millones



Tramo intervenido sector PR 0+0000 – Entrada Armenia: Inversión \$ 1,400 millones

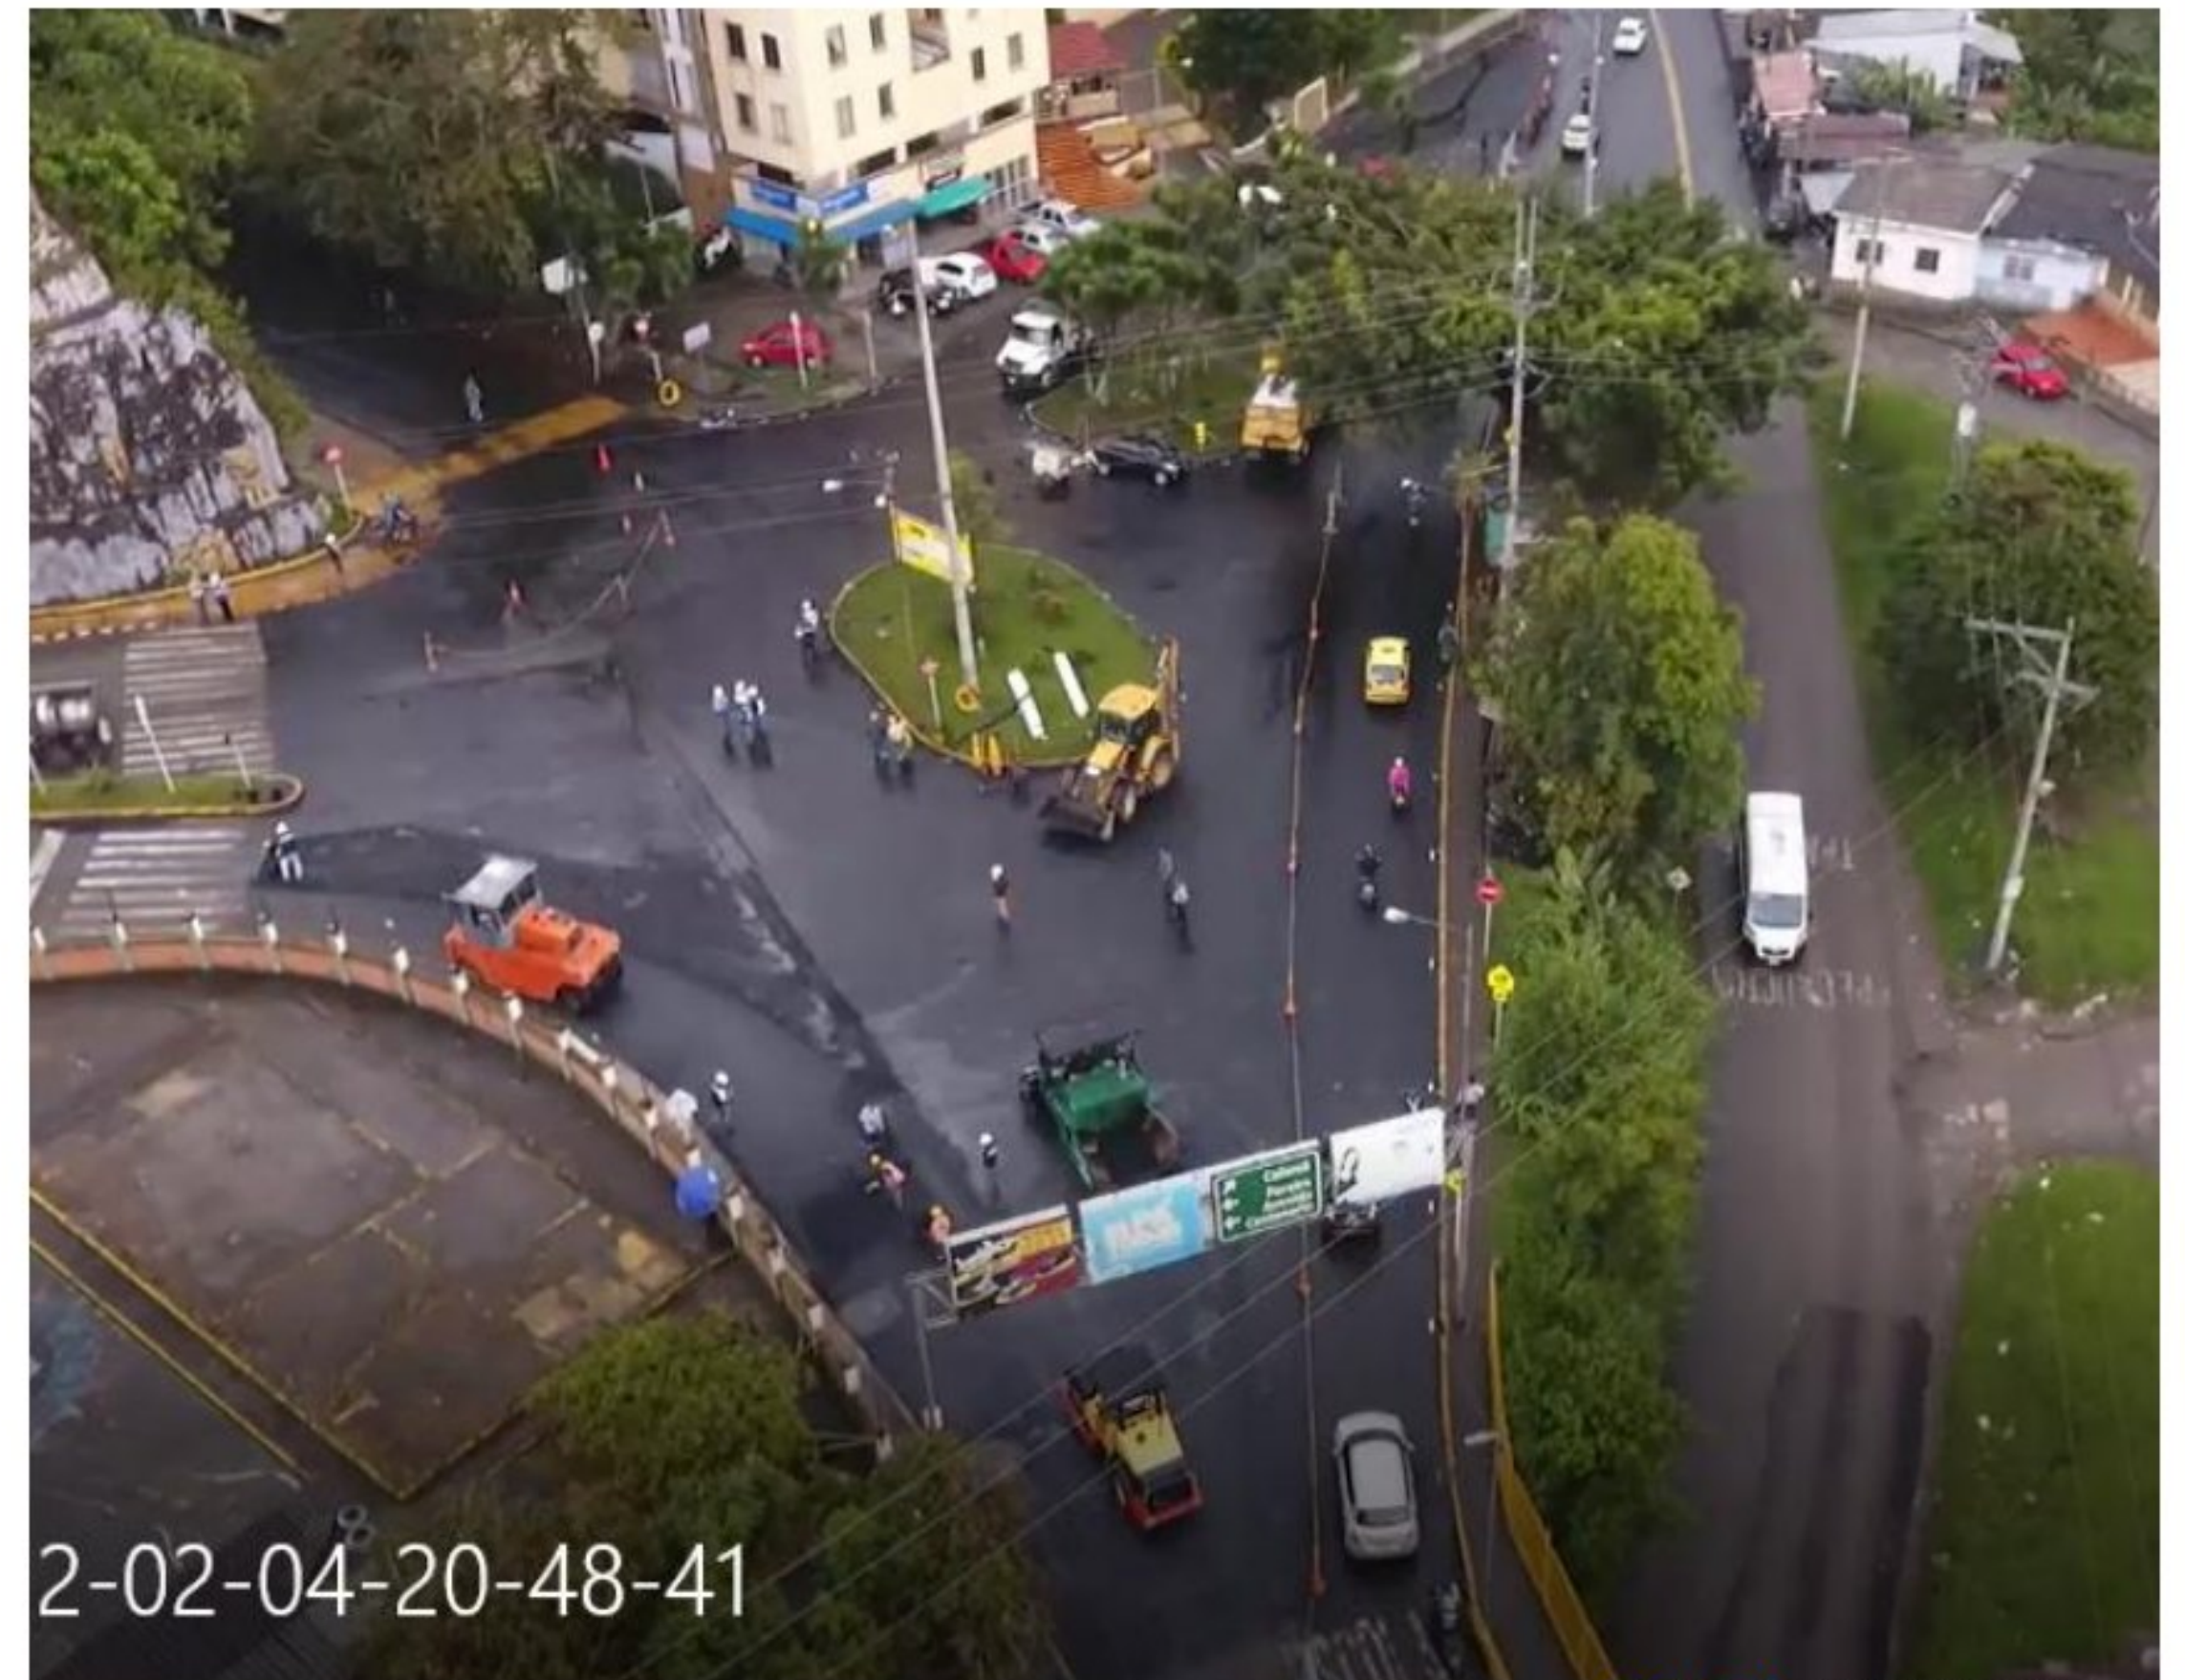

INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA




SECTOR ARMENIA - MONTENEGRO

TRAMO 2

LOCALIZACIÓN

Tramo Armenia – Montenegro

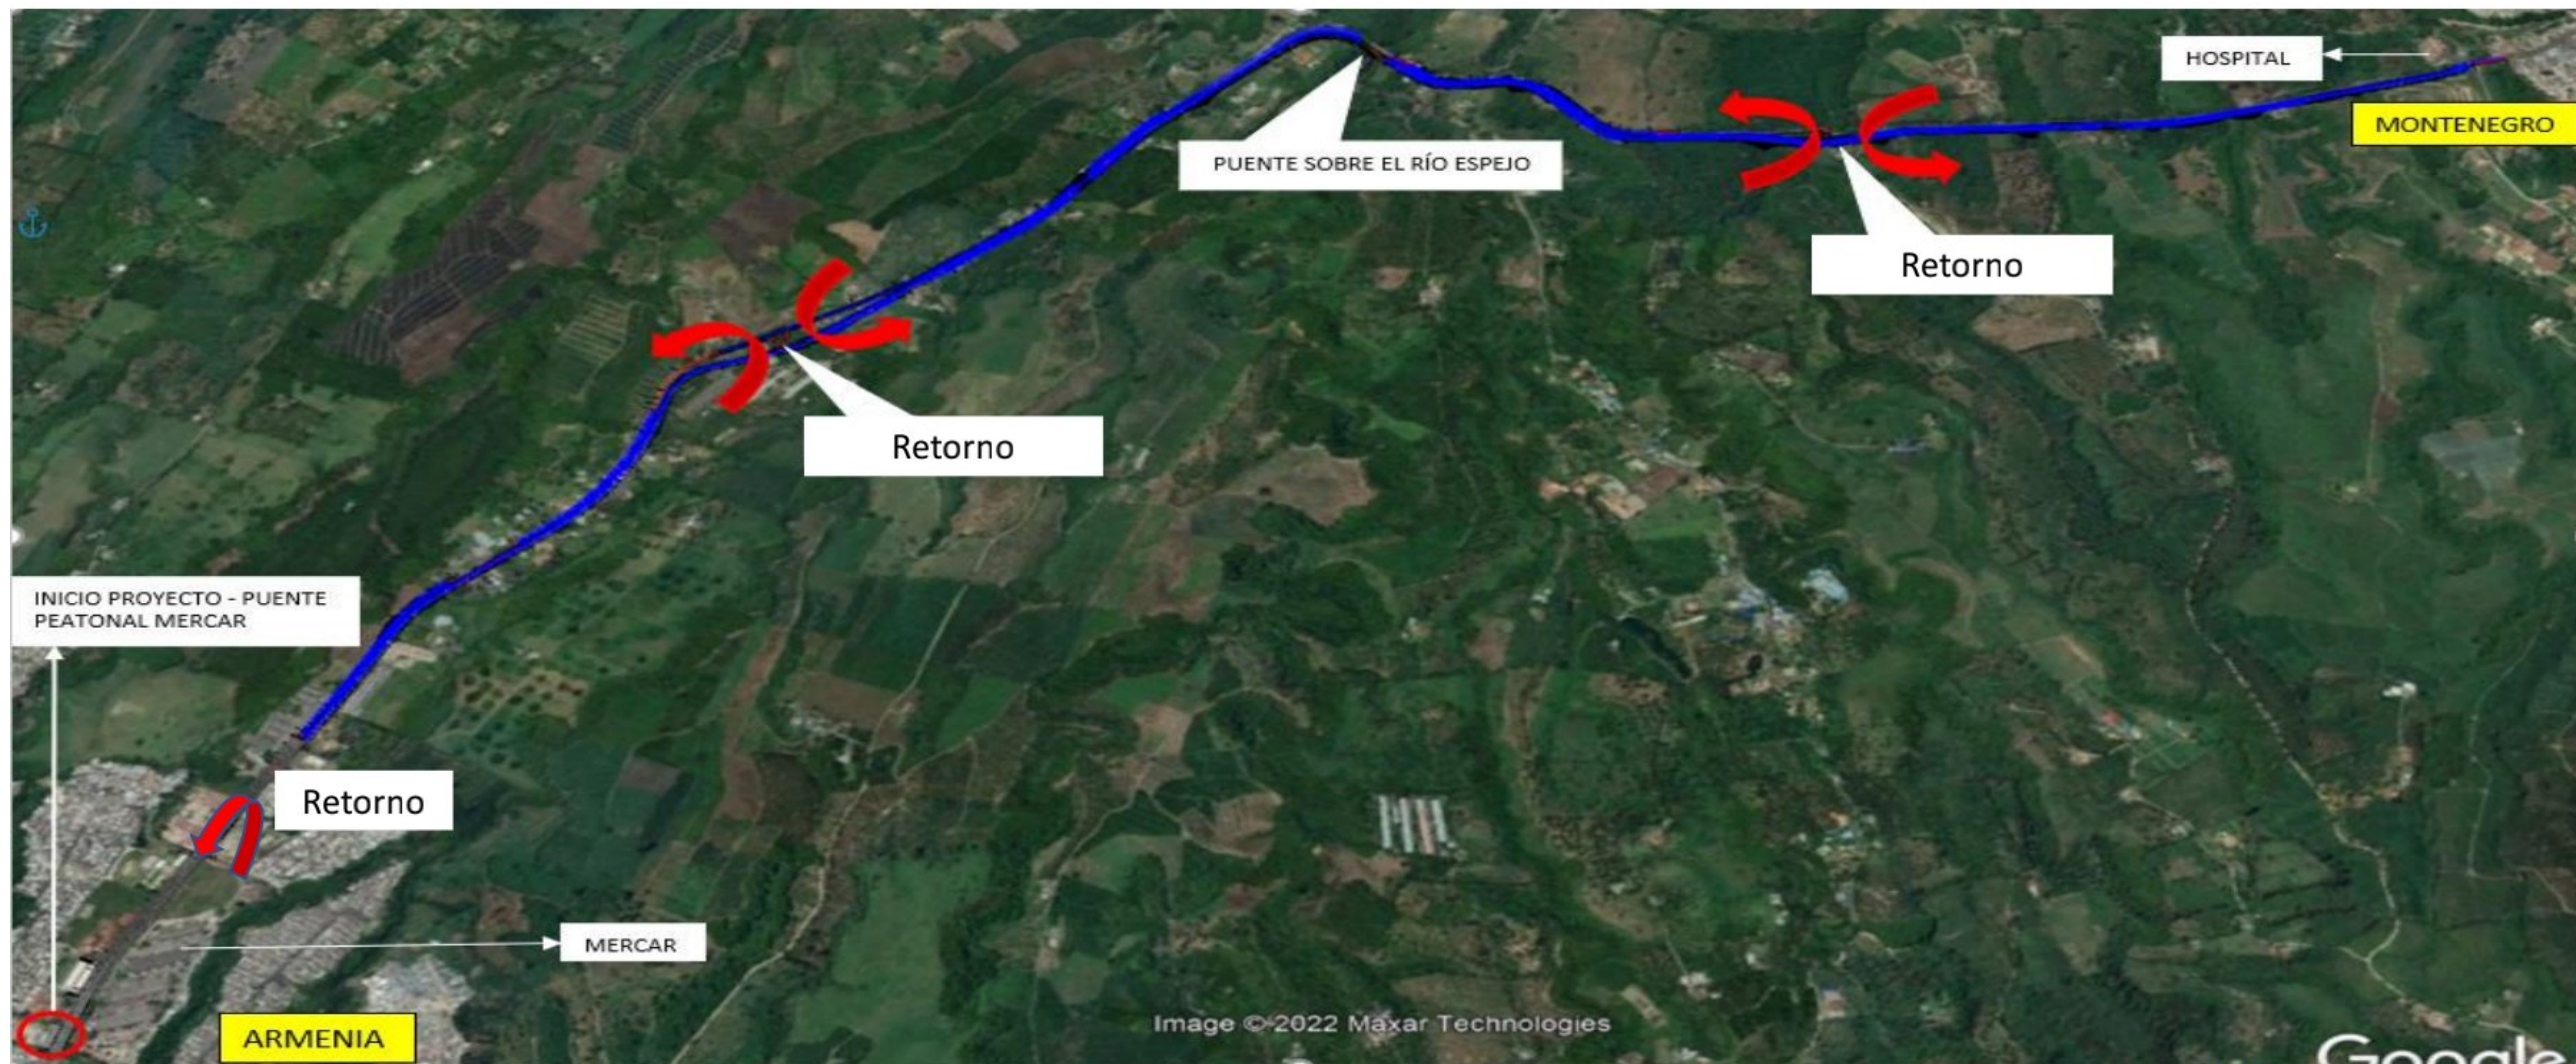

INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA



Tramo K 0+0000 – K 7+0500



Trazado del Corredor Projectado K 0+0000 – K 3+0900



Trazado del Corredor Proyectado K 0+0000 – K 3+0900


ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SECTOR DE MERCAR PR 0+0000 AL PR 0+0500

- Catastro de redes de servicios público (Edeq- Efigas – Epa – Movistar)
- Excavaciones y nivelación de subrasante
- Construcción de obras civiles subterranización redes Movistar – Edeq
- Construcción acometida de acueducto Mercar
- Construcción de cajas de control redes Edeq- Movistar
- Ajustes de los volúmenes geométrico-pavimentos – geotécnico - estructural

Tramo intervenido sector K0+000 al K0+0500 AVANCE OBRAS MERCAR



Tramo intervenido sector K0+000 al K0+0500 AVANCE OBRAS MERCAR

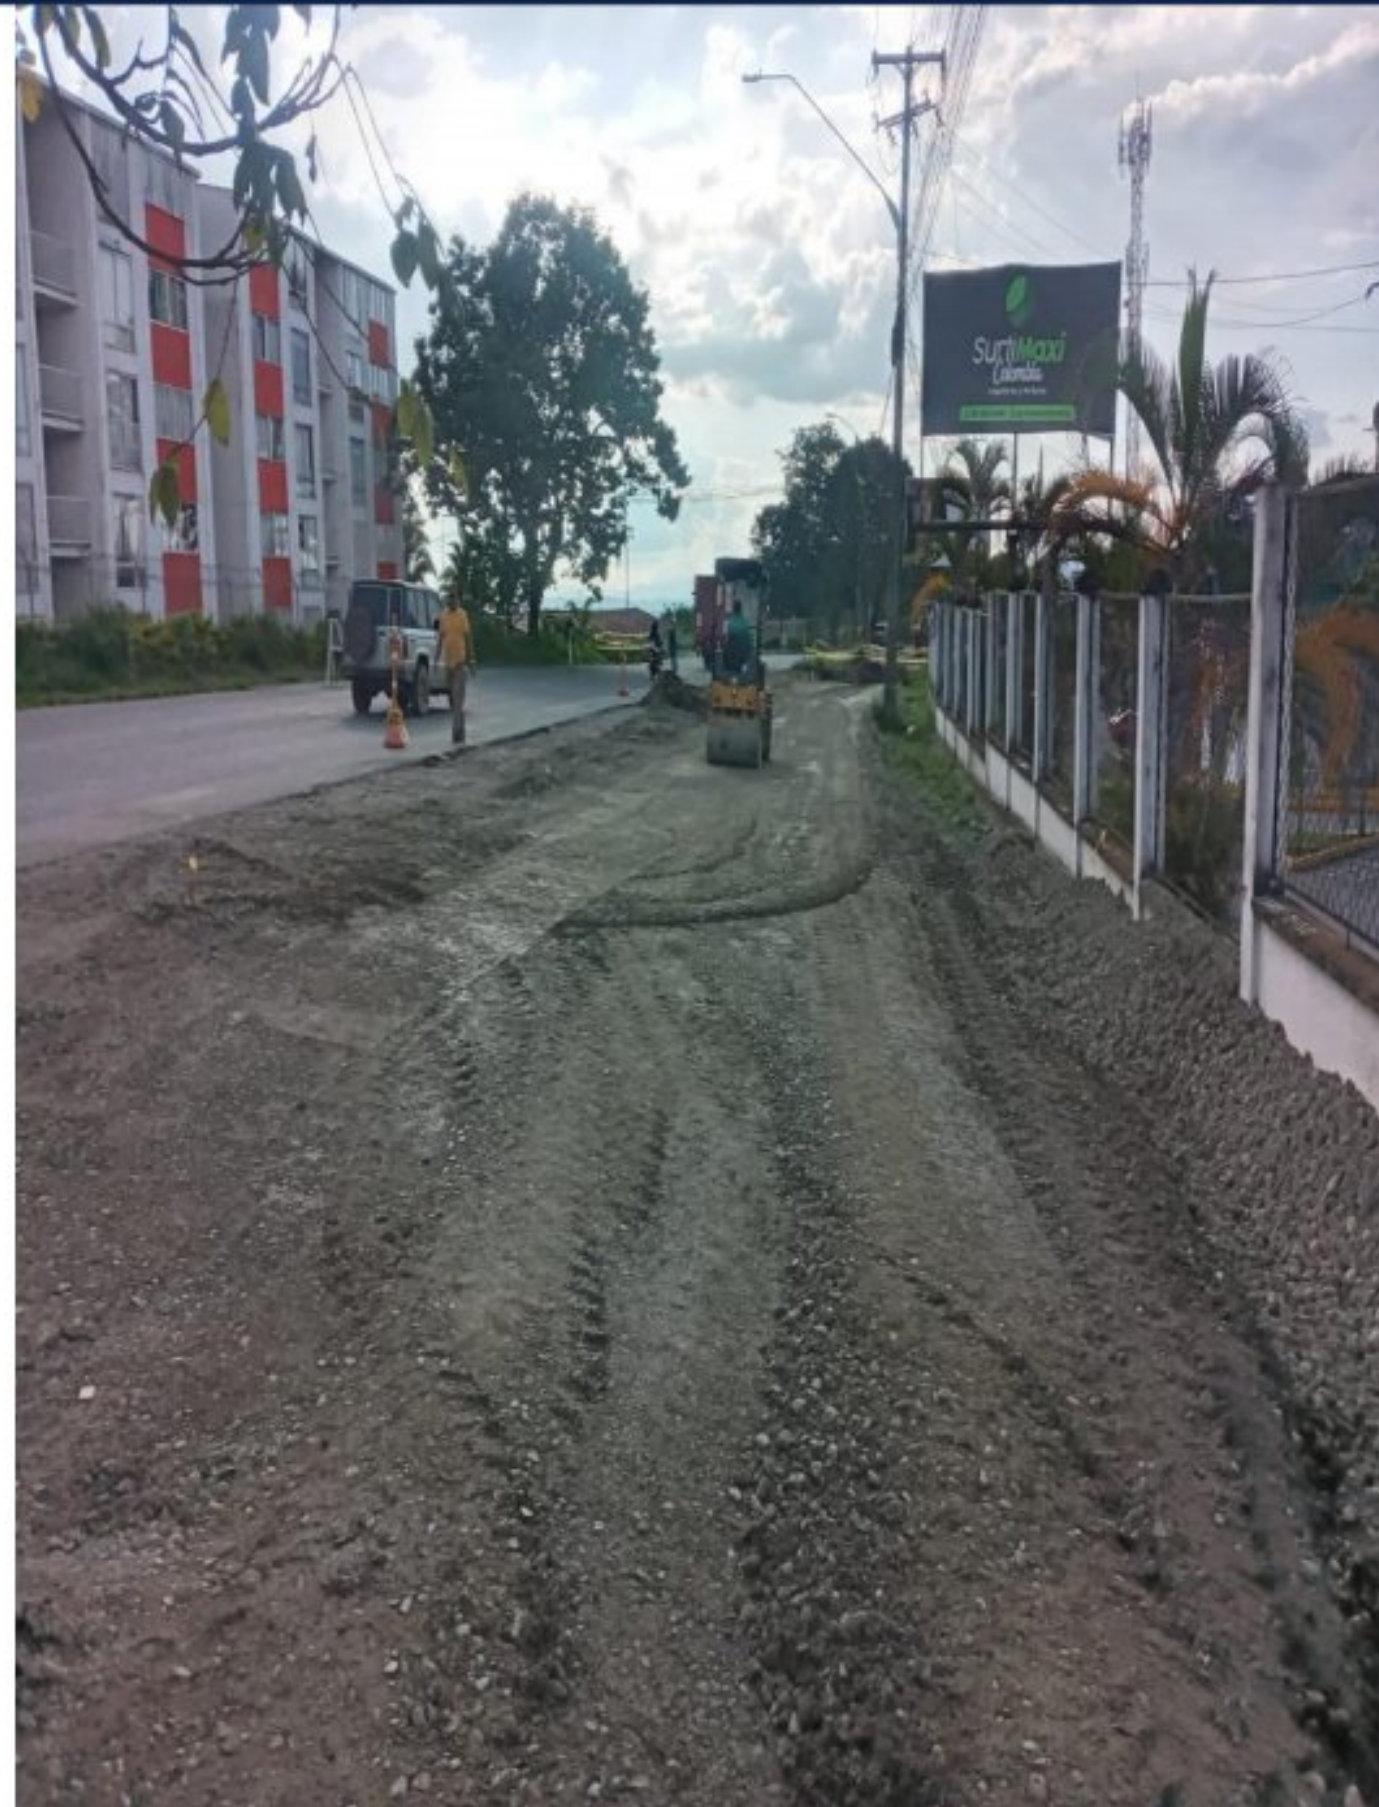

Tramo intervenido sector K0+000 al K0+0500 AVANCE OBRAS MERCAR



INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**



REACTIVACIÓN ECONÓMICA



2/09/2021 4:17:51 p. m.

Quindío

Construcción Intervial Andino 1913



Retorno PR 0+0500 – 0+0700 (intervención Inmediata)




Retorno ubicado en predio de la Alcaldía Municipal . Se cuenta con permiso de intervención Voluntario y en tramite de traslado las construcciones existentes y redes de energía.

Tramo Armenia- Montenegro PR 0+700 – 3+600



Tramo Armenia- Montenegro PR 3+600 – 3+900

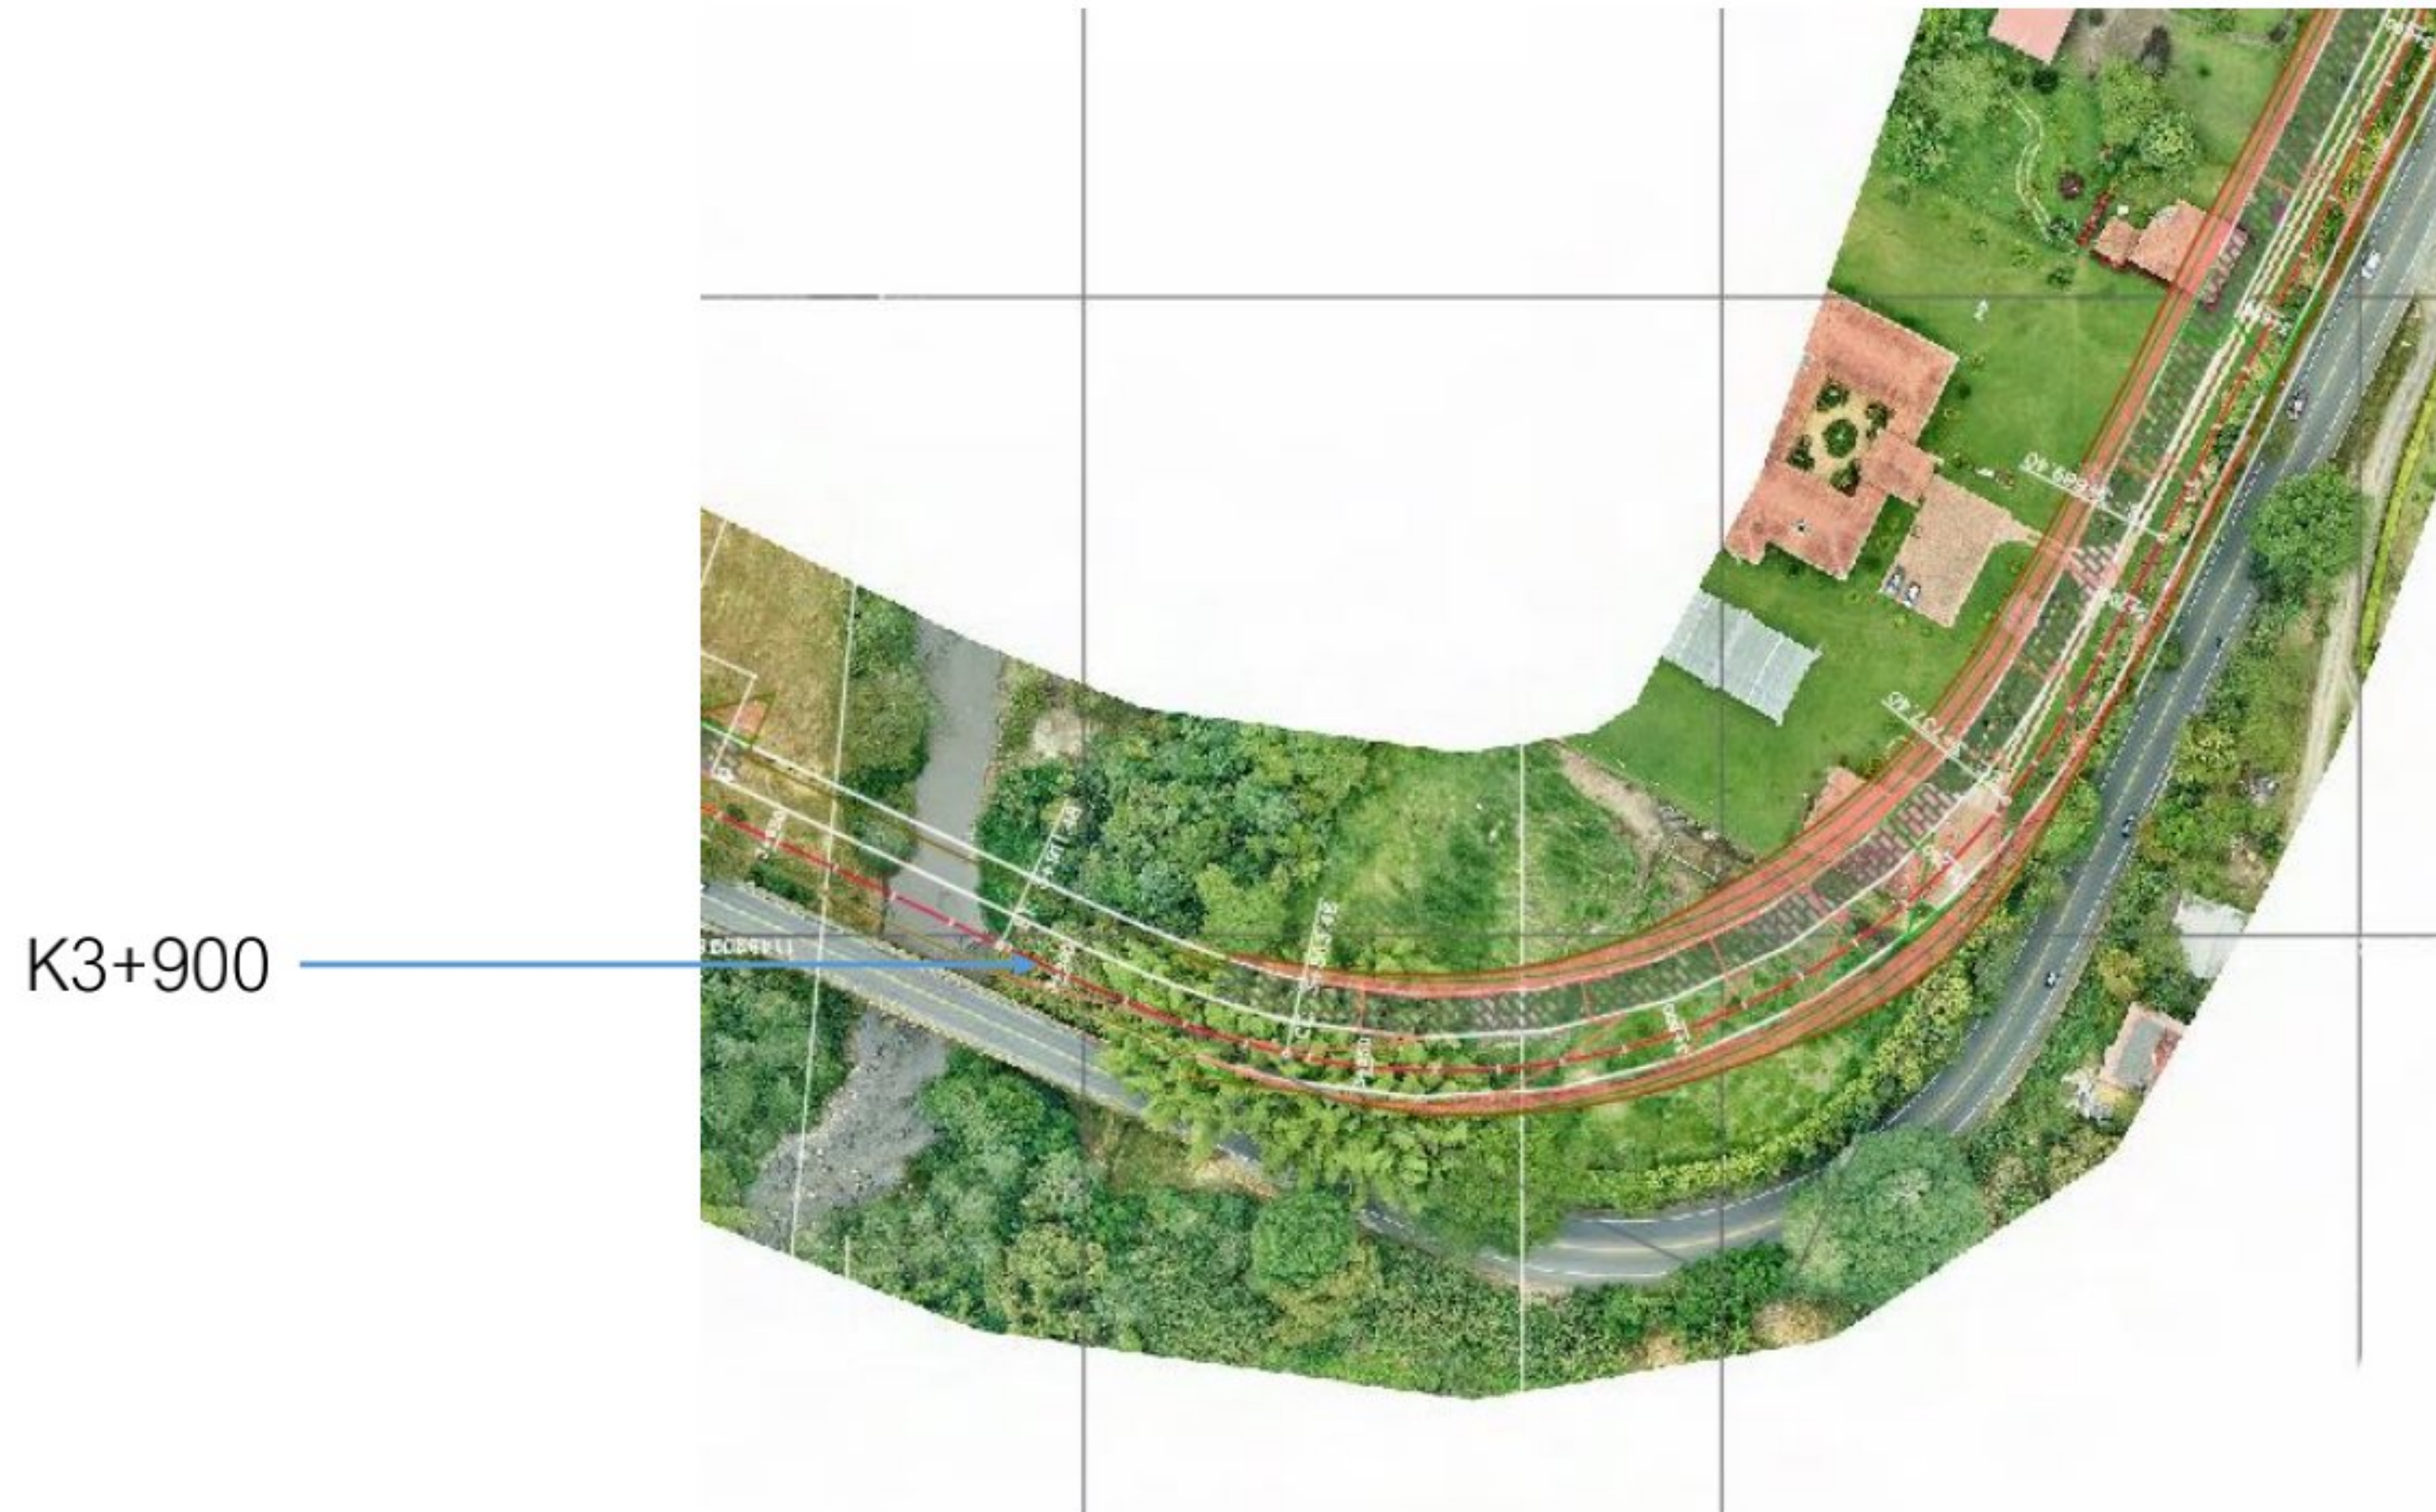

SECTOR No. 2 – ARMENIA - MONTENEGRO

PR0+000 MERCAR (ARMENIA) – PR K4+000 PUENTE SOBRE EL RIO ESPEJO (ARMENIA) – **TRAMO PAGA**

Predios Requeridos por diseño	Fichas Aprobadas INVIAS	Estudios Aprobados INVIAS	Fichas y estudios en Revisión INTERVENTORIA	Fichas y estudios en elaboración	En Elaboración de AVALUOS COMERCIALES
88 Pr.78 - Mej. 10	0	0	14	74	14

Actividades ambientales

PERMISO AMBIENTAL	ENTIDAD AMBIENTAL	TRAZABILIDAD
Permiso de aprovechamiento forestal árboles aislados	Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)	1. Radicado N° E09216 del 06 de agosto del 2021. 2. Auto de inicio N° SRCA-AFI-025-26-01-2022 del 26 de enero del 2022. 3. Visita de evaluación realizada el 04 de febrero del 2022. 4. Resolución PAF 000159 9 de febrero de 2022
Permiso de Levantamiento parcial de veda de flora epífita	Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)	1. Radicado N° E09286 del 09 de agosto del 2021 2. Auto de inicio N° SRCA-AFI-025-26-01-2022 del 26 de enero del 2022. 3. Visita de evaluación realizada el 04 de febrero del 2022. 4. Resolución PAF 000159 9 de febrero de 2022
Concesión de agua Rio Espejo	Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)	1. Radicado N° E07753 del 06 de julio del 2021. 2. Visita de evaluación realizada el 12 de noviembre del 2022. 3. Otorgada mediante resolución 0002618 del 09 de diciembre del 2021.

Actividades ambientales

PERMISO AMBIENTAL	ENTIDAD AMBIENTAL	TRAZABILIDAD
Sitio de Disposición Final – ZODME	Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)	1. Solicitud concepto ambiental CRQ Radicado N. E11448-21 del 22 de septiembre del 2021 2. Concepto de viabilidad por parte de la CRQ N° 20177 del 15 de diciembre del 2021, radicado al contratista el 31 de enero del 2022.
Licencia Ambiental	Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)	1. En ejecución EIA.

Traslado de redes de servicios públicos

ACTIVIDAD	ENTIDAD	ESTADO
Permiso Intervención espacio público K0+000 al K0+650	ALCALDIA DE ARMENIA	Otorgado
Traslado Redes EPA	Contratista EPA	En ejecución traslado redes EPA costado derecho K0+040/350 sector Mercar por el contratista. Pendiente documento escrito de EPA sobre obras de ampliación redes actuales costado izquierdo Armenia a K4. Ya se tiene diseño de la EPA e implantado con el diseño geométrico de la vía.
Traslado redes de EDEQ.	Contratista EDEQ	En ejecución traslado redes sector Mercar K0+000/500 por el contratista. El diseño de subterranización de redes entre K0+500/K1+200 por parte de la EDEQ ya fue entregado e implantado.
Traslado redes de MOVISTAR	MOVISTAR	Definida línea de traslado de redes sector MERCAR. Acta de competencias firmada con Movistar.

ARMENIA – MONTENEGRO

Secciones Transversales




K0+000 – K0+700

K0+700 –
K3+900

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

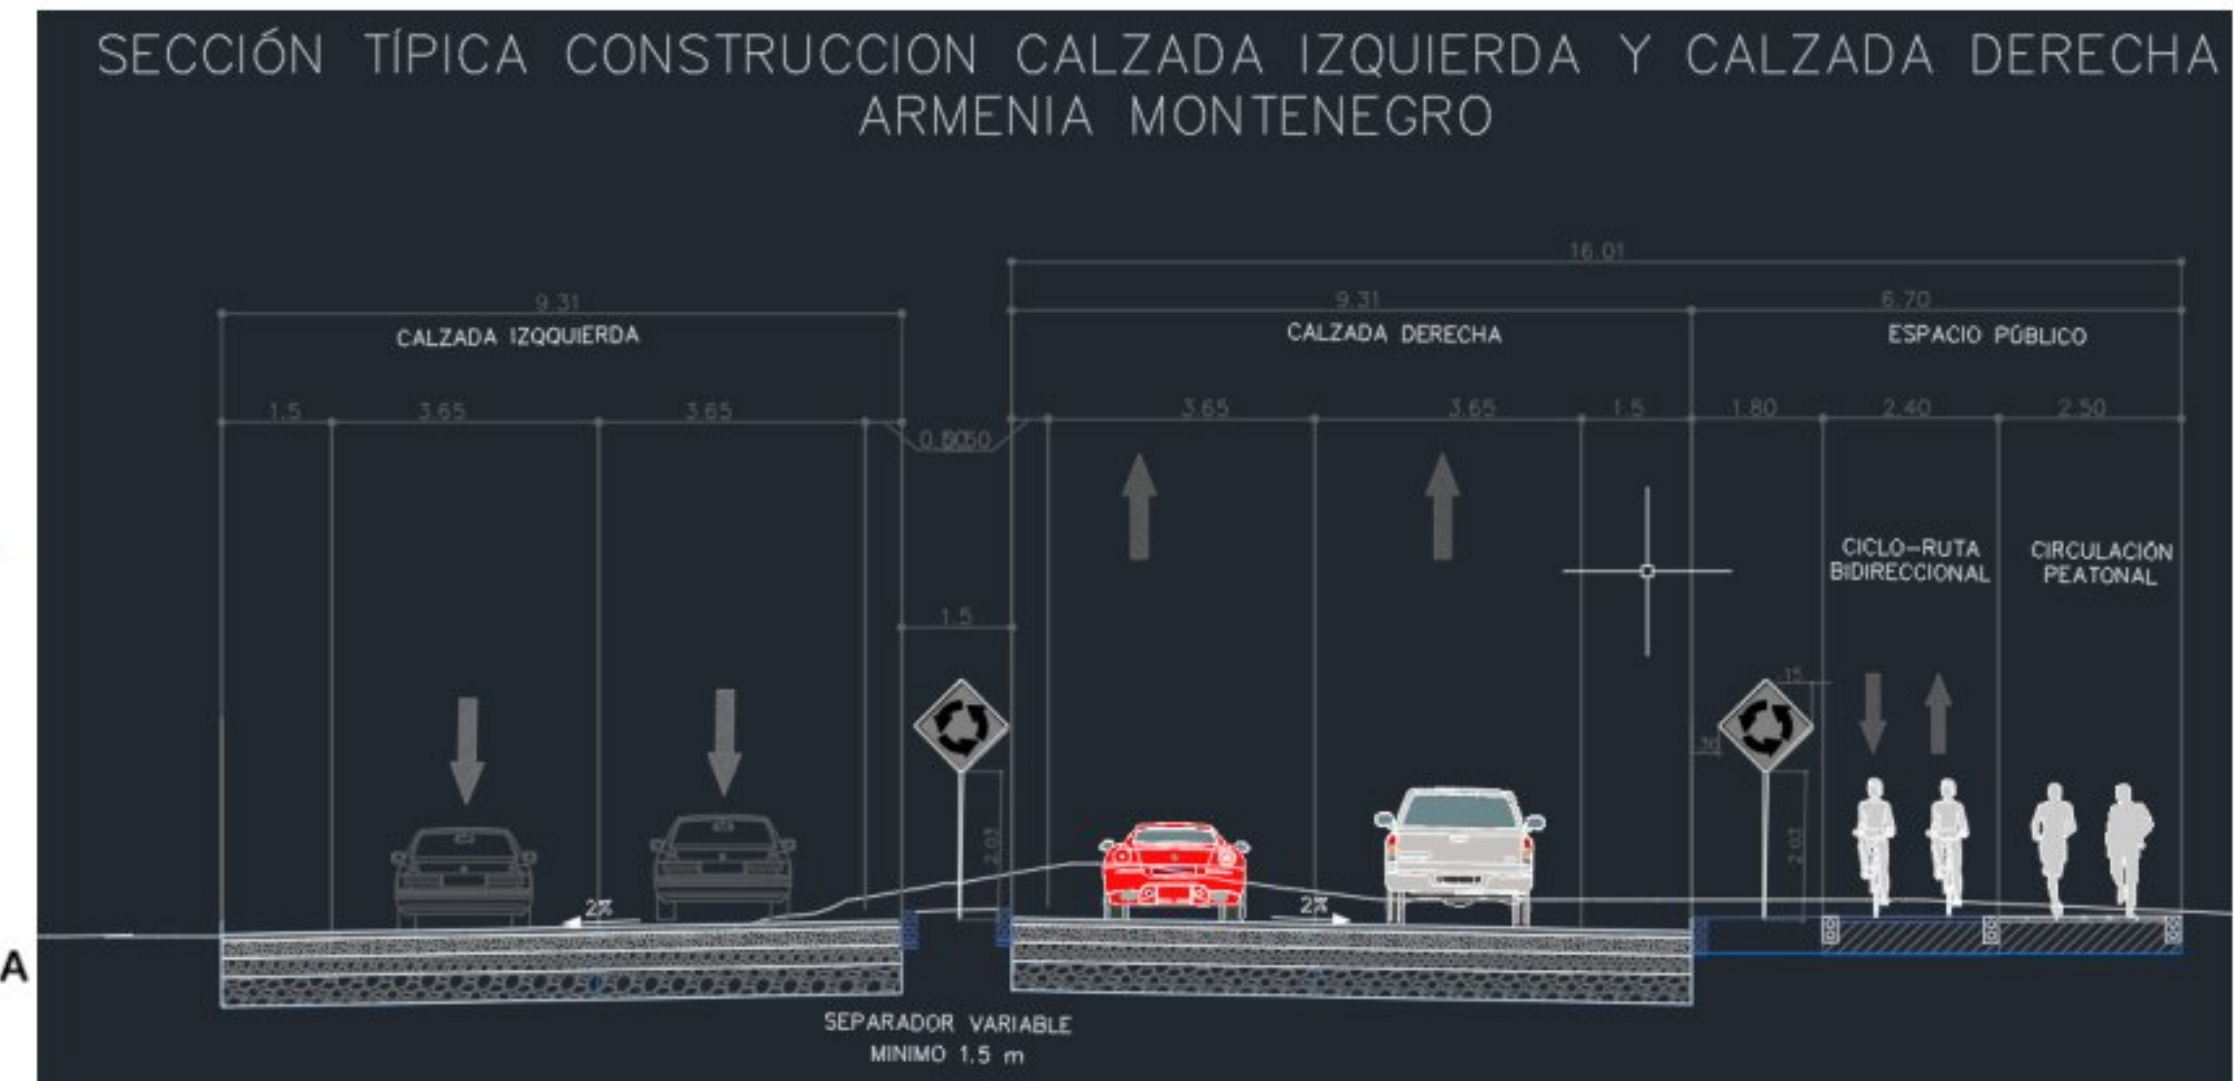

SECTOR MONTENEGRO - QUIMBAYA

TRAMO 03

Mantenimiento Montenegro - Quimbaya

Valor invertido \$ 1,400 millones rehabilitación Carpeta asfáltica tramos críticos



INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA



Mantenimiento Montenegro - Quimbaya

Valor invertido \$ 1,400 millones rehabilitación Carpeta asfáltica tramos críticos



INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA



Mantenimiento Montenegro - Quimbaya

Valor invertido \$ 1,400 millones rehabilitación Carpeta asfáltica tramos críticos



INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA



SECTOR QUIMBAYA - ALCALÁ

TRAMO 4

Mantenimiento Quimbaya – Alcalá

Valor invertido \$ 600 millones rehabilitación Carpeta asfáltica tramos críticos



INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA



Mantenimiento Quimbaya – Alcalá

Valor invertido \$ 600 millones rehabilitación Carpeta asfáltica tramos críticos



3 nov. 2021 8:49:25 a. m.
Quindío
Consorcio Intervial Andino 1913

INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA



Mantenimiento Quimbaya – Alcalá

Valor invertido \$ 600 millones rehabilitación Carpeta asfáltica tramos críticos



INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA



AREA SOCIAL



INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Servicio de atención a la comunidad SAU Tramo doble calzada Armenia – Calarcá.

Ubicación del SAU para la atención a la comunidad.

- Dirección: Barrio Bomberos 2 etapa, Manzana C casa 1
- Teléfono: 3103765789
- Email: socialarmenia2022@gmail.com
- Horario: lunes y Viernes
7:30 am a 5:00 pm



INVÍAS

COMPROMISO POR **COLOMBIA**

REACTIVACIÓN ECONÓMICA



Servicio de atención a la comunidad SAU Tramo doble calzada Armenia – Montenegro.

Ubicación del SAU para la atención a la comunidad.

- **Dirección:** Barrio Tomás Cipriano de Mosquera, Manzana C Casa # 1 Montenegro
- **Teléfono:** 3103765789
- **Email:** socialarmenia2022@gmail.com
- **Horario:** Martes y Jueves 7:30 am a 5:00 pm



GRACIAS

COMPROMISO POR
COLOMBIA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

